共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和２年４月

◆造成工事を進めております。

・地盤強度を高めるための土質改良工を開始しました。
　引き続き、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　　撮影日：４月 30 日

【西側 1 段目切土　植生シート】

【土質改良のようす】

・自走式土質改良機の中へ土を投入すると、機械の中で石灰と混合されて、改良された土が先端から排出されます

那須地区広域行政事務組合

共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和２年５月

◆造成工事を進めております。

・切土３段目まで植生シート張付が完了しました。６月は切土４段目の法面整形や植生工を順次施工していきます。

引き続き、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　撮影日：５月 28 日

【造成工事のようす】

那須地区広域行政事務組合

共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和２年６月

◆貯留構造物施設の地盤改良に着手しました。

・貯留構造物施設を建てるために必要な地盤強度を確保する地盤改良に着手しました。
　また、切土等の造成工事についても並行して進めております。
　引き続き、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　　撮影日：６月 30 日

【地盤改良のようす】パワーブレンダー工法を採用しています。

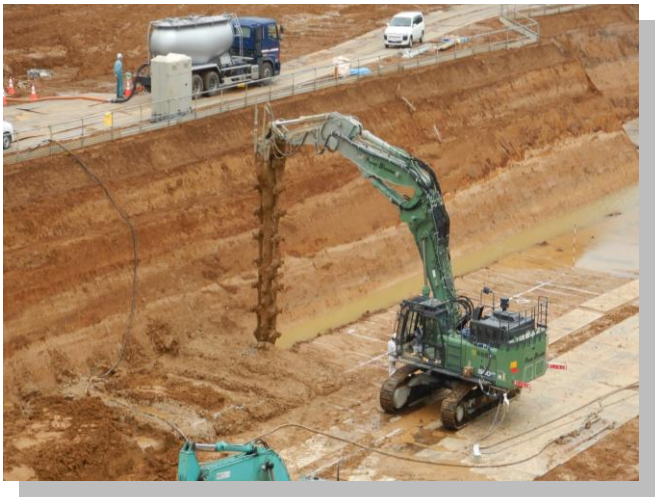

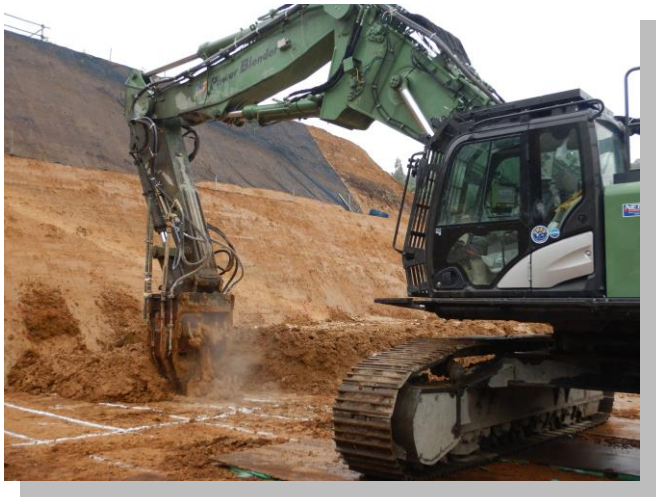

那須地区広域行政事務組合

共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和２年７月

◆地盤改良及び造成工事を進めております。

・先月に引き続き、地盤改良と切土等の造成工事を進めております。８月からは貯留構造物施設建築に係る鉄筋工、型枠工などの躯体構築工に取りかかる予定です。

引き続き、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　　撮影日：７月 31 日

【地盤改良のようす】

【造成工事のようす】

共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和２年８月

◆貯留構造物の本体工事に着手しました。

・貯留構造物本体のコンクリート打設に必要な鉄筋工事、型枠工事などに着手しました。
９月からは鉄筋工事、型枠工事が完了したブロックから順次、コンクリートの打設を行っていく予定です。
引き続き、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　　撮影日：８月25日

【鉄筋組立のようす】

那須地区広域行政事務組合

共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和２年９月

◆貯留構造物本体の工事を進めています。

・貯留構造物本体のコンクリートの打設を開始しました。鉄筋工事、型枠工事も引き続き進めてまいります。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　　撮影日：９月 27 日

【コンクリート打設のようす】

〇型枠の中へコンクリートを流し込んでいきます。

共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和２年１０月

◆貯留構造物本体の工事を進めています。

・貯留構造物本体の鉄筋工事、型枠工事、コンクリート打設を進めています。
引き続きご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　　撮影日：１０月２８日

【貯留構造物を上から見たようす】

那須地区広域行政事務組合

共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和２年１１月

◆貯留構造物本体の工事を進めています。

・貯留構造物本体の鉄筋工事、型枠工事、コンクリート打設を進めています。
引き続きご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　撮影日：11 月 27 日

【貯留構造物工事全体のようす】

【型枠工事のようす】

〇貯留構造物壁部の型枠についてはクレーンで吊って施工します。

那須地区広域行政事務組合

共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和２年 12 月

◆浸出水処理施設の杭打ち工事を行いました。

・浸出水処理施設を建てる地盤の基礎となる鋼管杭を打ちました。また、貯留構造物本体の鉄筋工事、型枠工事、コンクリート打設も進めています。

引き続きご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　　撮影日：12 月 22 日

【浸出水処理施設の杭打ち工事のようす】

Oe-pile next 工法を採用しています。

【貯留構造物本体工事のようす】

那須地区広域行政事務組合

共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和３年１月

◆貯留構造物本体の工事を進めています。

・貯留構造物本体の鉄筋工事、型枠工事、コンクリート打設を進めています。
引き続きご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　　撮影日：１月 26 日

【貯留構造物本体工事を上から見たようす】

那須地区広域行政事務組合

共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和３年２月

◆浸出水処理施設工に着手しました。

・浸出水処理施設基礎部分の鉄筋工や型枠工をするため、地盤の掘削を行いました。
　貯留構造物本体については引き続きコンクリート打設を進めています。

引き続きご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　　撮影日：２月 24 日

【浸出水処理施設　掘削後(均しコン打設完了)のようす】

那須地区広域行政事務組合

共同一般廃棄物最終処分場建設工事の進捗状況

令和３年３月

◆貯留構造物本体周辺の埋戻し工に着手しました。

・貯留構造物本体の周辺に土を埋戻ししていきます。
　また、浸出水処理施設の基礎となる部分にコンクリート打設しました。
　引き続きご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【現在の建設地】　　撮影日：３月 26 日

【貯留構造物本体周辺埋戻しのようす】

【浸出水処理施設のようす】

〇埋戻しには調整池が作られる場所の土を掘削して使用します。

那須地区広域行政事務組合
